

◇令和6年度 下水道事業の実施状況について

1. 全体事業費【令和6年度末 整備予定率（普及率）98.8%】

525,034千円（見込額）

※内 45,800千円 次年度繰越

下水道施設等の新設および改築にかかる事業費（施設の維持管理費を除く）

2. 全体事業費のうち国庫交付金対象事業費

233,800千円

※次年度繰越額を含む

3. 国庫交付金（交付率1/2）

116,900千円

※次年度繰越額を含む

4. 実施事業の内訳（全15件）

① 汚水整備（新設、改築）工事 8件

② 測量設計業務委託等 7件（次年度へ一部繰越）

（理由：入札不調により落札者決定
に不測の日数を要したため）

令和6年度 下水道事業の主要な実施状況一覧表


(工事関係)

番号	工 事 名	場 所	工事内容	進捗状況
①	石部口工区管布設工事	石部口	・開削工φ200 L=99.5m ・推進工φ250 L=107.4m	3月完了予定
②	石部北工区（JR下推進）管布設工事	石部北	・推進工φ250 L=17.8m	3月完了予定
③	石部北工区（立坑）管布設工事	石部北	・立坑φ2000 N=1箇所 ・2号組立マンホール N=2箇所	3月完了予定
④	石部口工区舗装復旧工事	石部口	・舗装復旧工 A=4,277m ²	10月完了
⑤	夏見西工区舗装復旧工事	夏見	・舗装復旧工 A=2,600m ²	11月完了
⑥	下水道施設改築更新工事	菩提寺他	・改築更新φ200 L=61.1m ・マンホール蓋交換 N=45箇所	3月完了予定
⑦	三雲東工区管布設工事	三雲	・開削工φ200 L=701.9m	3月完了予定
⑧	里・菩提寺工区管布設工事	三雲・菩提寺	・開削工φ150 L=142.0m	3月完了予定
	工 事 計 8 件			

(委託関係)

番号	工 事 名	場 所	工事内容	進捗状況
⑨	石部口工区他現場技術業務委託	全域	・現場技術管理 一式	3月完了予定
⑩	石部口工区設計業務委託	石部口	・管渠開削設計 L=330m	3月完了予定
⑪	下水道施設点検調査業務委託	全域	・人孔目視点検 N=81基 ・管口カメラ調査 N=81基	1月完了
⑫	下水道ストックマネジメント基本計画変更業務委託	全域	・ストックマネジメント変更計画策定 一式	3月完了予定
⑬	下水道総合地震対策耐震補強設計業務委託	全域	・下水道施設耐震診断 L=193m ・管口耐震化設計 N=168箇所 ・マンホール更生工法 N=57基	3月完了予定
⑭	甲西北汚水中継ポンプ場硫化水素対策設計業務委託	日枝町	・硫化水素対策設計 一式	3月完了予定
⑮	雨水出水浸水想定区域図作成に伴う分析業務委託	全域	・区域図作成に係る分析業務 一式	R7年度へ繰越 10月完了予定
	委 託 計 7 件			

令和6年度 下水道事業 建設改良費(主要な事業) 位置図

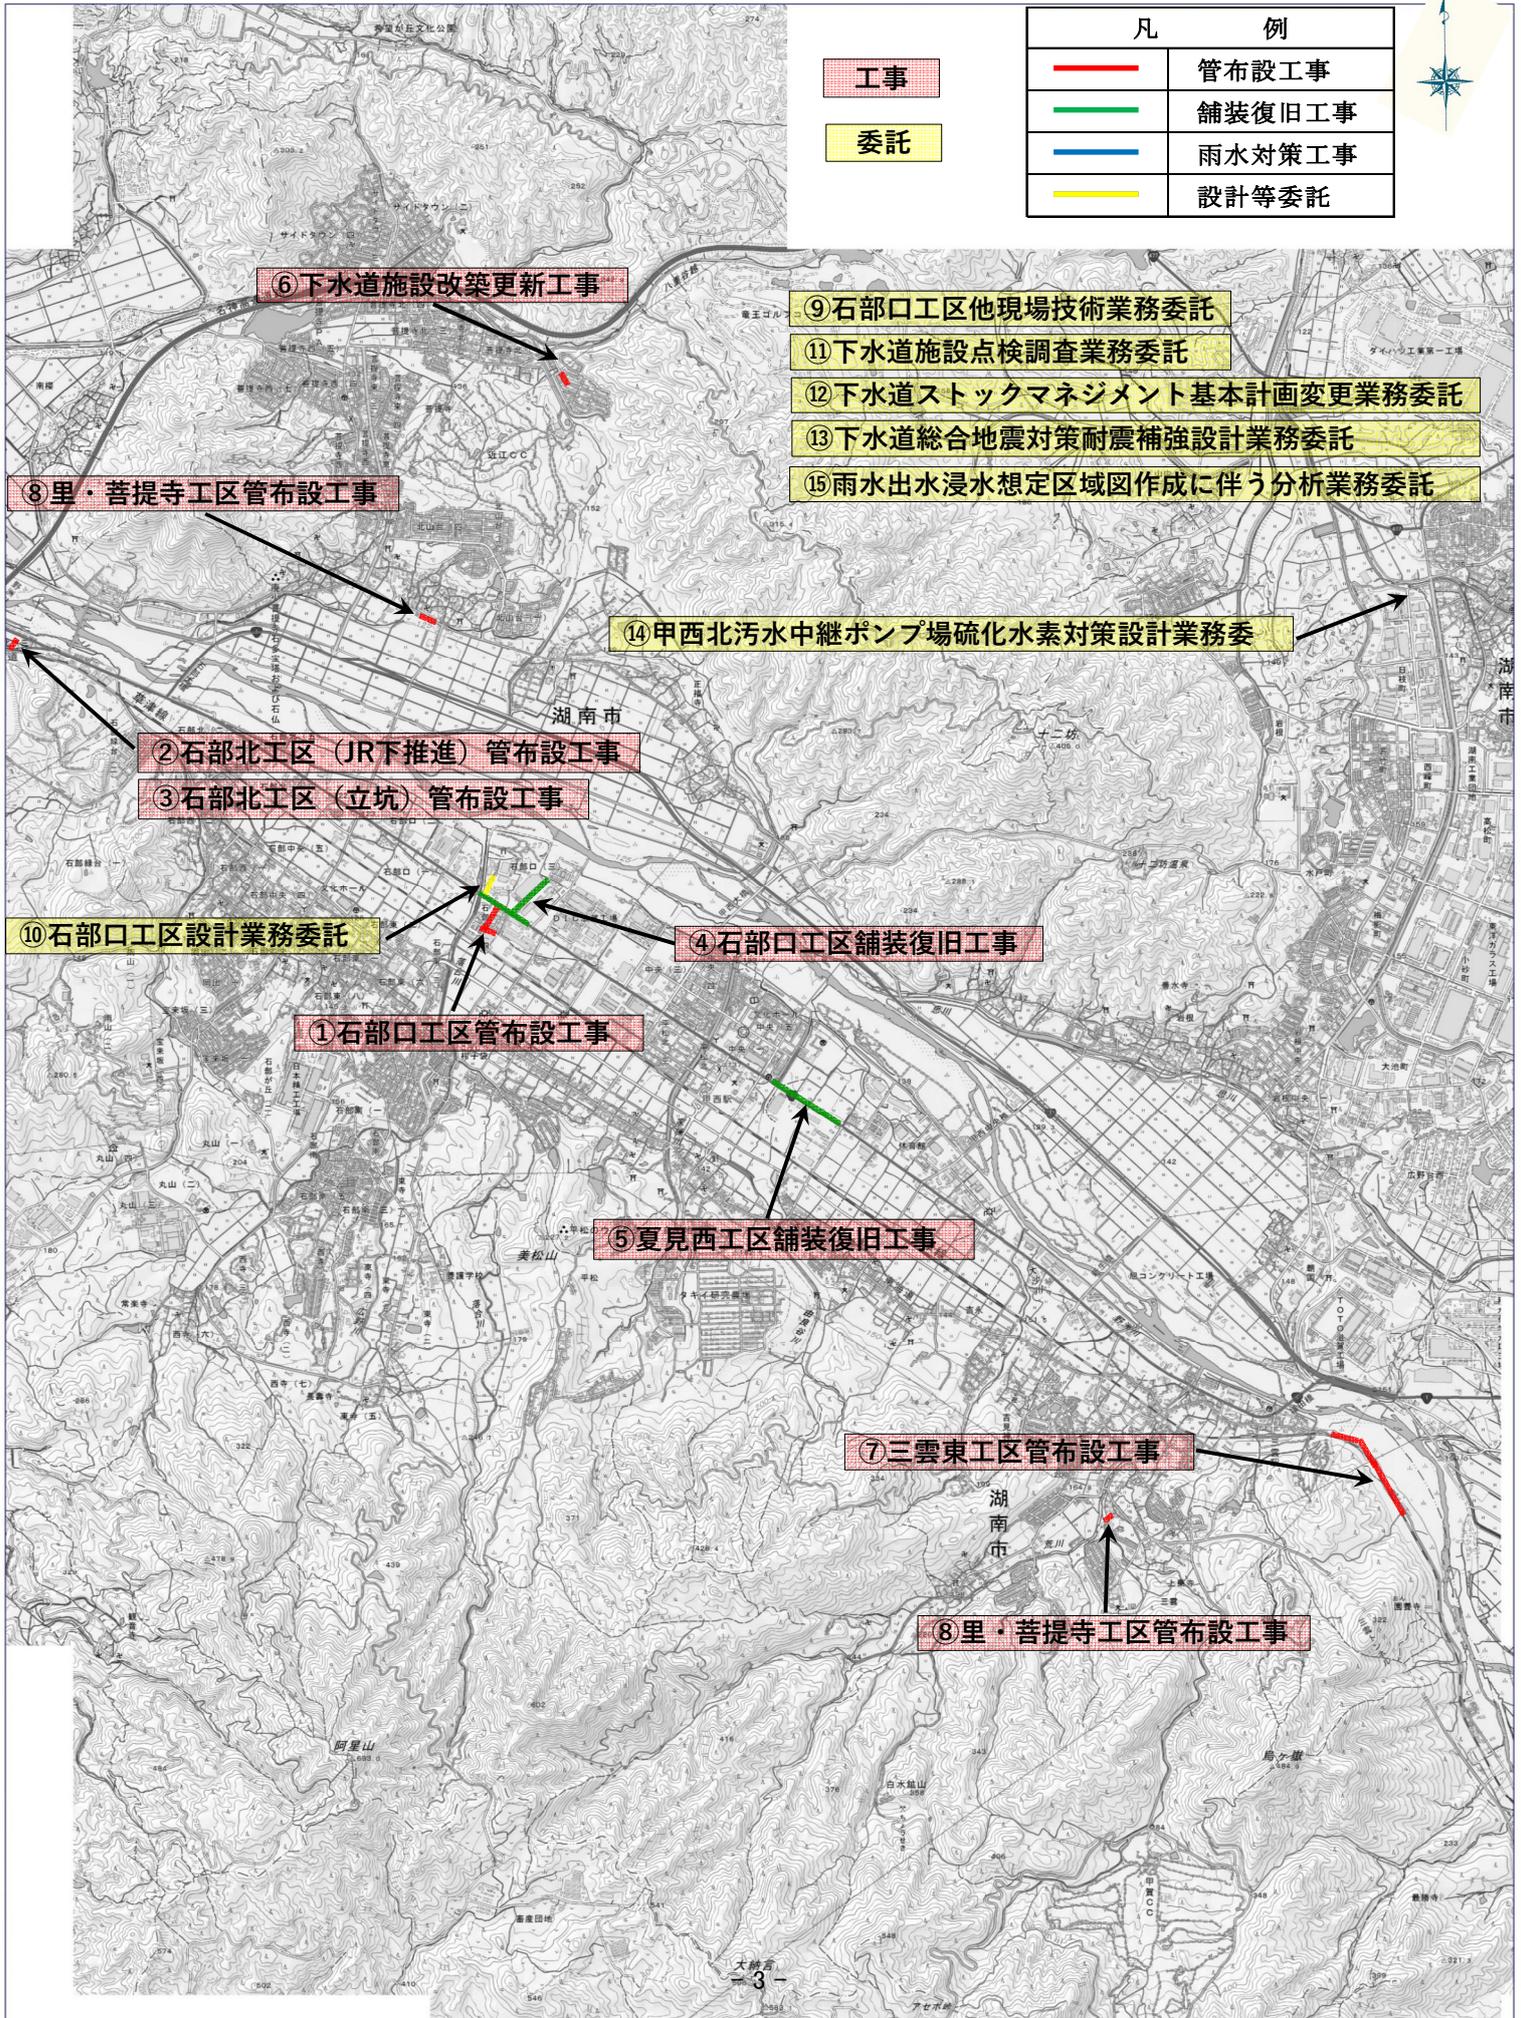

工事

委託

凡 例	
—	管布設工事
—	舗装復旧工事
—	雨水対策工事
—	設計等委託



⑥ 下水道施設改築更新工事

⑨ 石部口工区他現場技術業務委託

⑪ 下水道施設点検調査業務委託

⑫ 下水道ストックマネジメント基本計画変更業務委託

⑬ 下水道総合地震対策耐震補強設計業務委託

⑮ 雨水出水浸水想定区域図作成に伴う分析業務委託

⑧ 里・菩提寺工区管布設工事

⑭ 甲西北汚水中継ポンプ場硫化水素対策設計業務委

② 石部北工区 (JR下推進) 管布設工事

③ 石部北工区 (立坑) 管布設工事

⑩ 石部口工区設計業務委託

④ 石部口工区舗装復旧工事

① 石部口工区管布設工事

⑤ 夏見西工区舗装復旧工事

⑦ 三雲東工区管布設工事

⑧ 里・菩提寺工区管布設工事
