

◇令和7年度 水道事業の実施状況について

1. 全体事業費

見込額

371,988千円 (当初予算額)

※内 50,261千円 次年度繰越

水道管の新設、移設、更新等に係る事業費(維持管理費を除く)

2. 実施事業の内訳

(全 17 件)

① 施設更新工事 2 件 (一部次年度へ繰越)

(一部繰越理由)

国スポ・障スポにより施工禁止期間が発生したため。

② 水道管の更新工事 4 件

③ 舗装復旧工事 3 件

④ 測量設計業務委託等 8 件 (一部次年度へ繰越)

(一部繰越理由)

滋賀国道事務所、河川事務所、甲賀土木事務所、JRなど関係機関との協議に日数を要するため。

令和7年度 主要な水道事業の実施状況一覧


(工事関係)

図面番号	件名	場所	概要	工事期間
施設更新	正福寺3号送水ポンプ改修工事	正福寺	・吐出弁更新工事 一式	3月完了予定
	低濃度PCB含有変圧器改修工事	正福寺	・変圧器改修 一式	3月完了予定
新設・老朽管更新	みどりの村工区配水管布設替工事(第3工区)	菩提寺西	・100以下 L=1,280m	3月完了予定
	県道石部停車場線配水管布設替工事(その2工区)	石部西 石部中央	・100以下 L=500m	繰越予定 (R8.5月完了予定)
	沖の前線配水管布設替工事	石部口	・100以下 L=185m	2月完了予定
	東河原線配水管布設替工事	石部口	・75 L=139.5m	3月完了予定
舗装復旧工事	みどりの村舗装復旧工事(第2工区)	菩提寺西	・オールレイ工 A=1,600 m ²	R7.9.30完了
	県道石部停車場線舗装復旧工事(第1工区)	石部西	・オールレイ工 A=150 m ²	R7.10.31完了
	天満宮線舗装復旧工事	夏見	・舗装打換工 A=320m ²	-
	合計(工事 9 件)			

(委託関係)

図面番号	件名	場所	概要	工事期間
	アセットマネジメント計画他策定業務委託	市内	・計画策定業務 一式	3月完了予定
	中央監視装置等更新に係る基本検討業務委託	市内	・計画策定業務 一式	3月完了予定
	市道石部北工区線配水管布設替工事实施設計業務委託	石部北	・配水管布設替工事詳細設計 100以下 L=410m	繰越予定 (R9.3月完了予定)
	天満宮線配水管布設替工事詳細設計業務委託	夏見	・配水管布設替工事詳細設計 100以下 L=260m	R8.1.31完了
	石部西地区配水管布設替工事实施設計業務委託	石部西	・配水管布設替工事詳細設計 75 L=30m	R7.6.30完了
	舗装復旧工事測量設計業務委託	市内	・みどりの村工区 ほか	3月完了予定
	水道台帳更新業務委託	市内	・台帳更新業務 一式	3月完了予定
	現場技術業務委託	市内	・現場管理業務 一式	3月完了予定
	合計(委託 8 件)			


令和7年度 水道事業 建設改良費(主要な事業)位置図

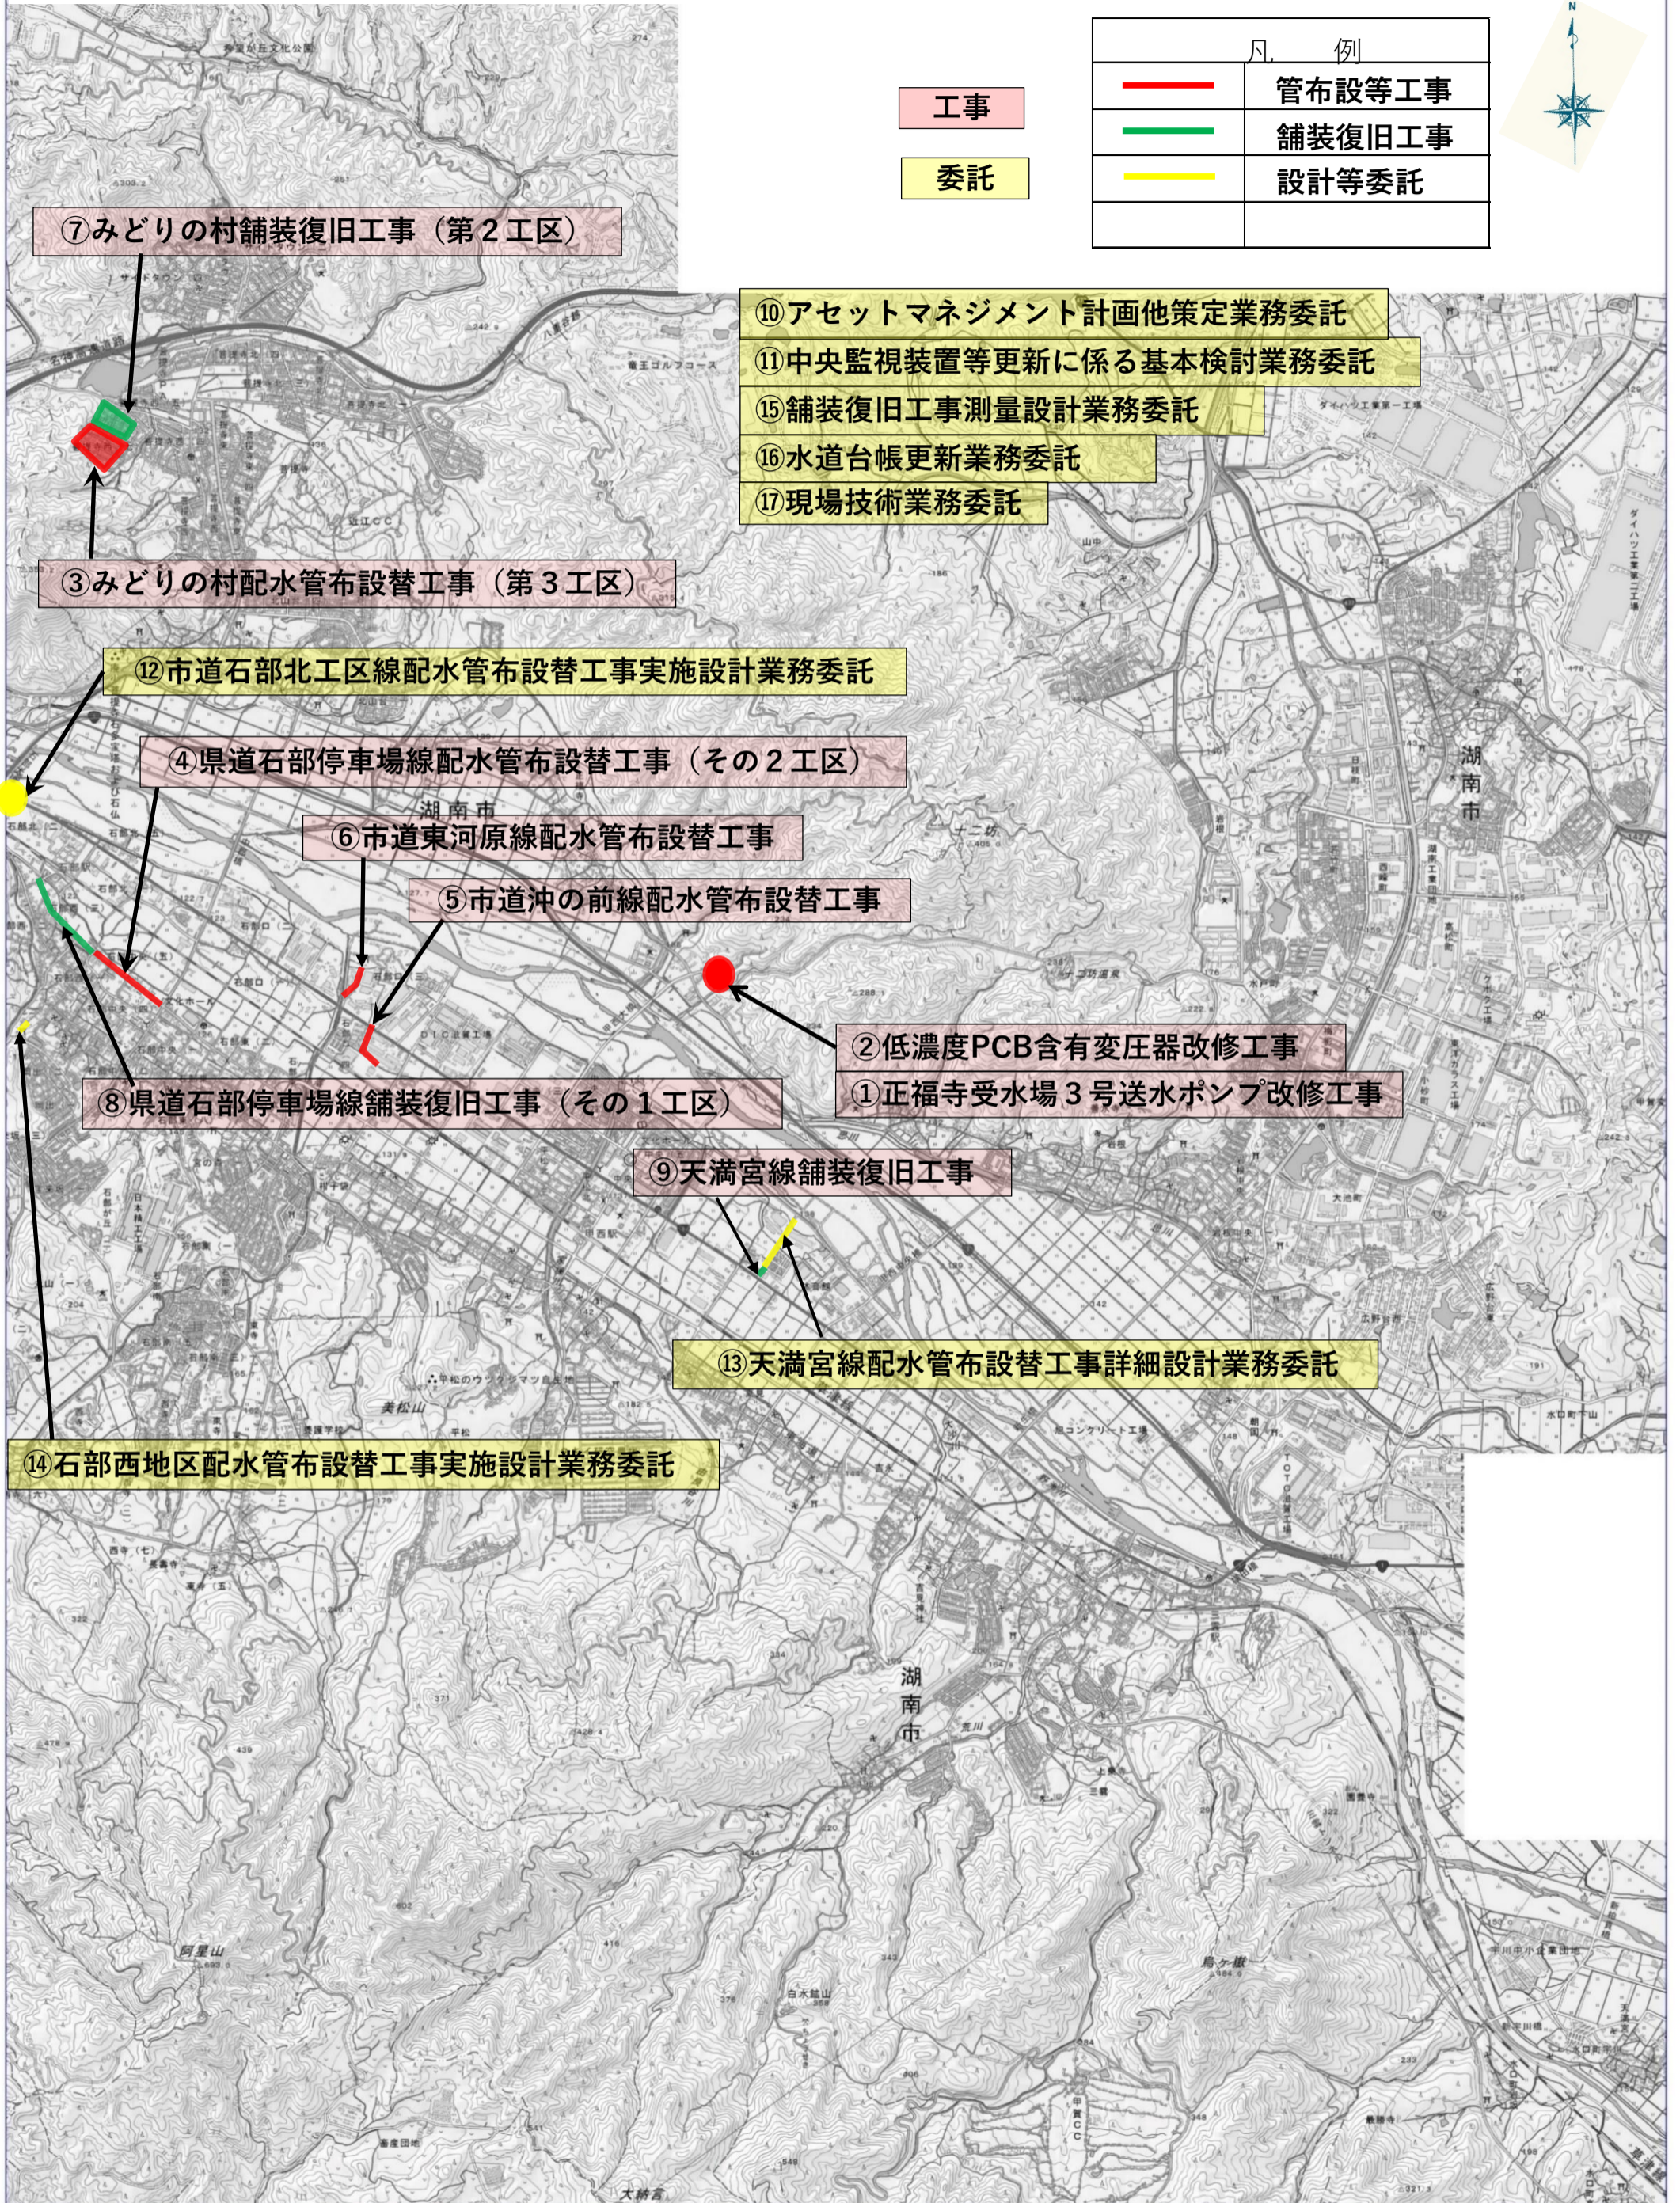

工事

委託

凡 例	
—	管布設等工事
—	舗装復旧工事
—	設計等委託



⑦みどりの村舗装復旧工事 (第2工区)

③みどりの村配水管布設替工事 (第3工区)

⑫市道石部北工区線配水管布設替工事实施設計業務委託

④県道石部停車場線配水管布設替工事 (その2工区)

⑥市道東河原線配水管布設替工事

⑤市道沖の前線配水管布設替工事

②低濃度PCB含有変圧器改修工事

①正福寺受水場3号送水ポンプ改修工事

⑧県道石部停車場線舗装復旧工事 (その1工区)

⑨天満宮線舗装復旧工事

⑬天満宮線配水管布設替工事詳細設計業務委託

⑭石部西地区配水管布設替工事实施設計業務委託

⑩アセットマネジメント計画他策定業務委託

⑪中央監視装置等更新に係る基本検討業務委託

⑮舗装復旧工事測量設計業務委託

⑯水道台帳更新業務委託

⑰現場技術業務委託
